## 令和7年11月20日

# 長浜市議会総務教育常任委員会

# 資 料

案件名	所管課	ページ
令和7年度学校施設環境改善交付金の採択状況と今後の対応に	教育総務課	2
ついて	אים ככניטוי ניו אני	_
長浜市学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針の策定に	教育改革推進課	1 0
ついて(経過報告)		1 0

## 教育委員会事務局

所管委員会	総務教育常任委員会
所管局・課	教育総務課

令和7年度学校施設環境改善交付金の採択状況と今後の対応について

学校施設の改修工事は、文部科学省の学校施設環境改善交付金を活用し実施しています。

今年度、当該交付金は近年の学校整備の動向により予算配分が少なくなっており、 また、国の採択方針が学校統合、特別支援学校新増設、耐震化、防災機能強化を最 優先することに変更されました。

このため、校舎の長寿命化改良事業に対する国の予算措置の状況が厳しく、当市が要望していた当該交付金が一部不採択となったことから、予定していた事業の内容を以下のとおり変更します。

#### 1. 学校施設環境改善交付金 令和7年度の採択経過

令和7年4月17日	1 次内定	
令和7年6月2日	交付決定(1 次)	A, B
令和7年6月20日	2 次内定	
令和7年7月16日	交付決定(2次)	©
令和7年9月2日	3 次内定	なし

#### 2. 長寿命化改修工事

## ①浅井小学校(本館等) 契約済

<u> </u>		フトヤンの1		
全体二	工事費: 682,602,800 円	交付金		
R6	0円	国庫 1/3	交付決定額: 80,000円	
R7	364,398,100円	国庫 1/3	交付決定額: 25,924,000 円A	不採択額: 57,450,000円
R8	318,204,700円	国庫 1/3		未採択額: 61,270,000円

- ※令和6年12月19日契約 → 現在工事中(外壁等取壊し済)
- ※引続き国庫交付金採択要望中。採択状況によって財源を検討。

#### 【今後の方針】 ⇒工事継続

【スケジュール】R7.4 着工 → R8.8 工事完了 → R8.10 仮設校舎解体完了

## ②北中学校(東校舎)契約済

全体二	工事費: 479,303,000 円	交付金		
	1	-		
R6	0 円	国庫 1/3	交付決定額:	
			64,000 円	
R7	222,555,300円	国庫 1/3	交付決定額:	不採択額:
			なし	54,445,000 円
R8	256,747,700円	国庫 1/3		未採択額:
				59,142,000 円

- ※令和6年12月19日契約 → 現在工事中(外壁等取壊し済)
- ※引続き国庫交付金採択要望中。採択状況によって財源を検討。

## 【今後の方針】 ⇒<u>工事継続</u>

【スケジュール】R7.4 着工 → R8.8 工事完了 → R9.3 仮設校舎解体完了

## ③湖北中学校(南・中校舎)第1期 工事完了

全体工事費: 651,673,000円		交付金		
R5	0円	国庫 1/3	交付決定額: 59,000円	
R6	311,949,000円	国庫 1/3	交付決定額: 78,123,000円	
R7	339,724,000円	国庫 1/3	交付決定額: 87,155,000 円®	

<sup>※</sup>令和 5 年 12 月 20 日契約 →令和 7 年 8 月工事完了

#### 湖北中学校仮設校舎賃貸借

	契約額	100.00%	286,000,000	
令和6年度	設置完了時	40.00%	114,400,000	140,022,000
	月払い分(9カ月分)	9.24%	26,433,000	140,833,000
令和7年度	月払い分(5カ月分)	5.14%	14,685,000	
	改修工事完了時	20.00%	57,200,000	80,696,000
	月払い分(3カ月分)	3.08%	8,811,000	
令和8年度	月払い分(12カ月分)	12.32%	35,244,000	35,244,000
令和9年度	契約期間満了時	10.22%	29,227,000	29,227,000

④湖北中学校(北校舎) 第2期 未発注

債務	負担行為額 1,070,000,000 円	交付金		
R7	約 3,000,000 円	国庫 1/3	交付決定額:	不採択額:
			837,000 円©	約 70,000 円
			(エレベーター分のみ)	
R8	約 900,000,000 円	国庫 1/3		未採択額:
				約 160,000,000 円

#### 【検討内容】

- ○採択の見込みが立たないまま仮設校舎を賃借し続けることにより、必要のない 支出を続けることになる。
- 〇浅井小学校、北中学校改修工事を国庫採択なく実施することで市の財政負担が 増加し、市財政に大きく影響を与えることになり、これ以上の一般財源対応は 難しい。
- ○採択を受けているエレベーター設置工事を早期に発注する必要がある。

#### 【今後の方針】

⇒交付決定があったエレベーター部分のみ発注 + 第1期工事関連工事の実施



	エレベータ一部分			
		交付金		
R7	0円	国庫 1/3	交付決定額: 837,000 円© (エレベーター分のみ)	
R8	約 95,000,000 円	国庫 1/3		未採択額: 約 11,000,000 円

+

#### 第1期工事関連工事部分

- 工事費:約45,000,000円(補助対象外)
- ・渡り廊下接合部内装修繕
- ・工事内容変更に伴う必要所室の設置
- ・工事内容変更に伴う警報・弱電関係配線の繋ぎ直し
- ・工事内容変更に伴う受変電設備(PAS等)の移設・配線工事
- ・工事内容変更に伴う給排水配管の繋ぎ直し(仮設の露出配管の埋設工事、バルブの新設等)


【スケジュール】R7.12 債務負担行為の廃止、追加 R8.1~仮設校舎解体 → R8.2 入札 → R8.4 着工 → R9.3 工事完了 ※令和 7 年度国庫交付金採択要望は取り止め


#### ⑤西中学校体育館屋根防水等改修工事


全体二	[事費:			
	約 81,000,000 円		人的亚	
R7	約 81,000,000 円		不採択額:	約 30,000,000 円

【今後の方針】 ⇒交付金の不採択により R7 の工事発注は見送り 【スケジュール】R7.12 減額補正


※令和7年度国庫交付金採択要望は取り止めるが、令和8年度は採択要望。 採択されれば実施する方向で調整。

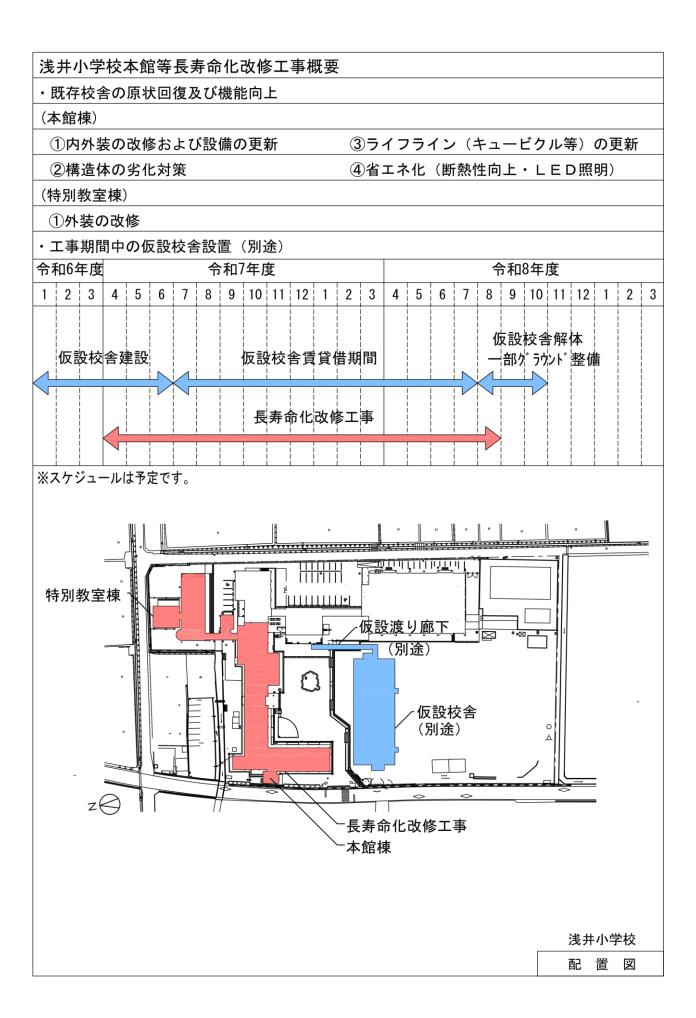

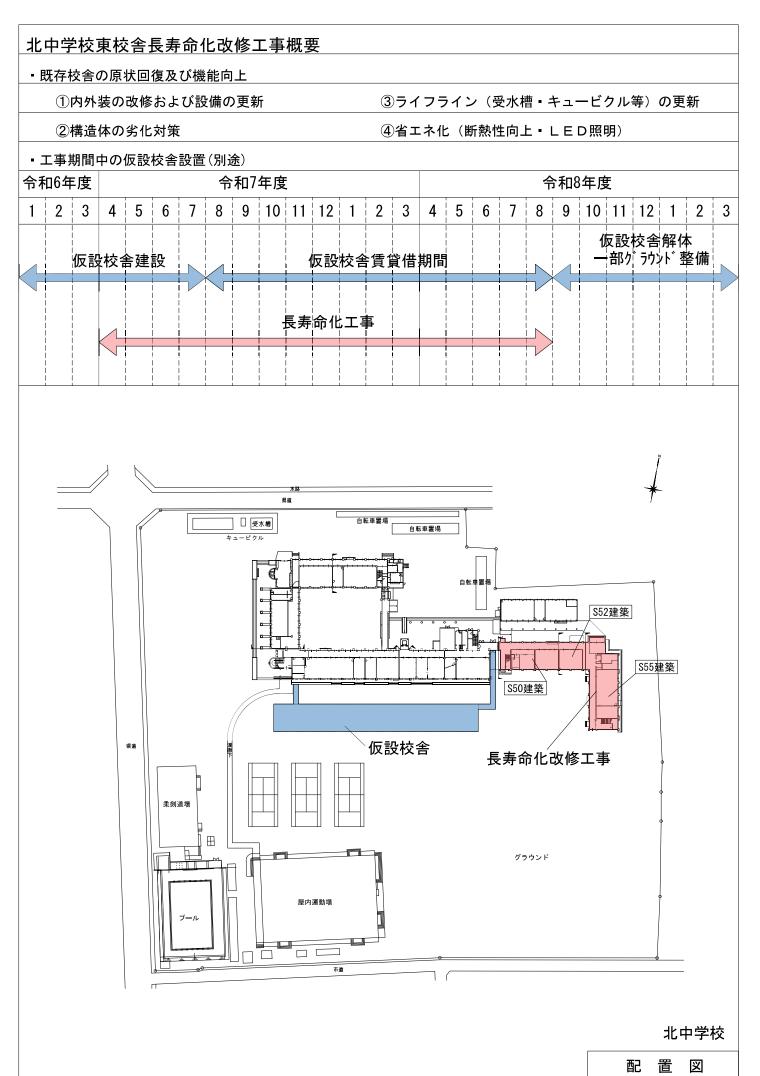

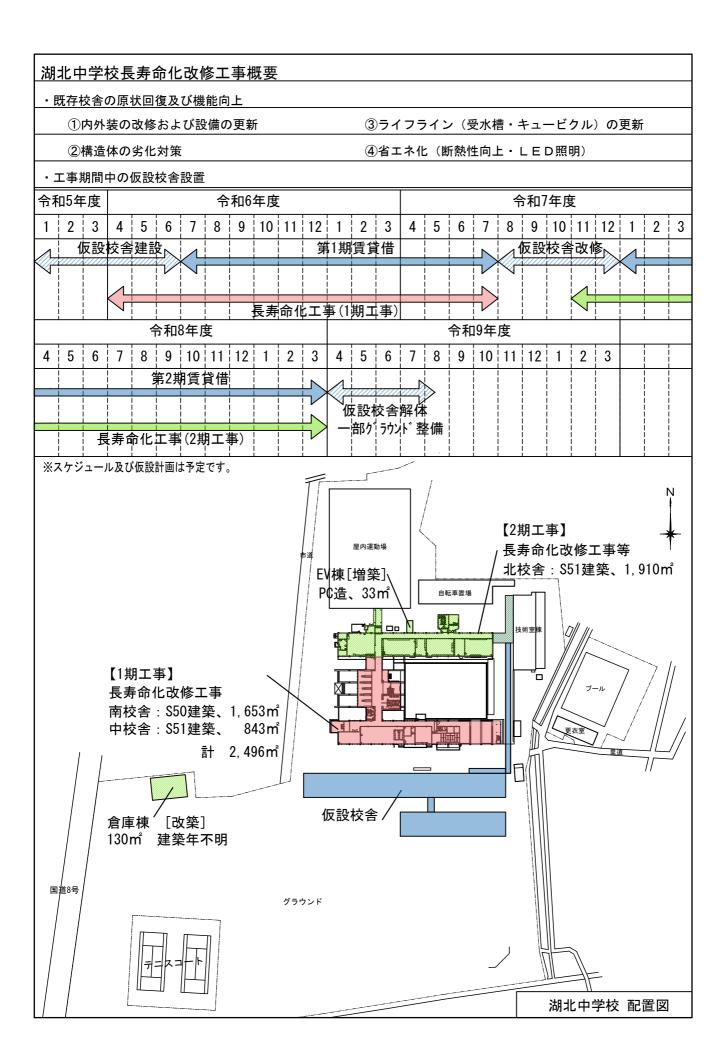

## 西中体育館屋根防水等改修工事

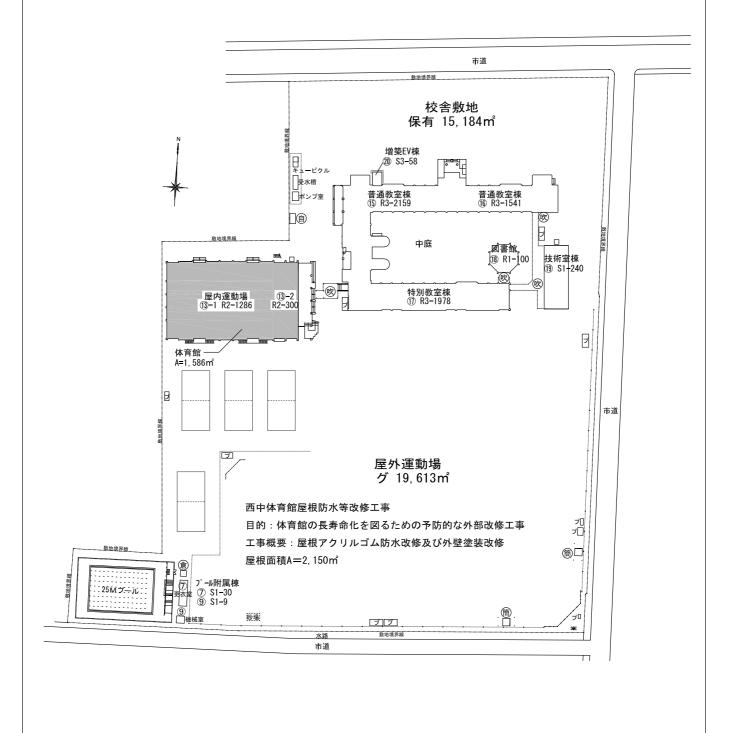

所管委員会	総務教育常任委員会
所管局・課	教育改革推進課

#### 案件名

長浜市学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針の策定について(経過報告)

#### 1. 趣旨

長浜市の学校園における規模の適正化や将来を見据えた適正配置の在り方、少子化に対応した活力ある学校園づくりの在り方などを踏まえた「長浜市学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針」の策定を進めてきましたが、次の理由によりスケジュールの変更を行います。

#### 2. 変更理由

これまで、令和6年度に開催しました長浜市学校園の適正規模・適正配置検討委員会からの意見を参考に、より良い教育環境の実現に向けて、学校園の適正規模として、クラス替えができる規模を軸に基本方針の検討を進めてきました。

この目指す規模を想定した場合、園区・校区が広域になることによる通園・通学や特色ある保育・教育活動、地域との連携などの課題があります。これらの課題は、現在、令和8年4月の統合に向けて準備を進めている地域でも論点となったところです。基本方針を策定するうえで、これらの課題に対する対応について、更に検討する期間が必要と判断し、策定期日を変更するものです。

#### 3. 策定期日

変更前:令和8年3月 変更後:令和8年10月

#### 4. これまでの主な取り組み

令和6年 5月20日	第1回長浜市学校園の適正規模・適正配置検討委
	員会を開催
令和6年 6月17日	第2回長浜市学校園の適正規模・適正配置検討委
	員会を開催
令和6年 6月19日	総務教育常任委員会で長浜市学校園の適正規
	模・適正配置に関する基本方針策定着手を報告
令和6年 7月10日	長浜市学校園の適正規模・適正配置検討委員会
~令和7年2月 3日	(第3回~第8回)を開催
令和7年 4月17日	総務教育常任委員会で経過報告
	「長浜市学校園の適正規模・適正配置検討委員会
	からの意見の取りまとめについて」

### 5. 今後のスケジュール

令和8年 3月 教育委員会委員協議会(経過報告)

4月 総務教育常任委員会(経過報告)

5月 教育委員会委員協議会(パブリックコメント前)

6月 総務教育常任委員会(パブリックコメント前)

パブリックコメント

8月 教育委員会委員協議会(最終案)

9月 教育委員会定例会(最終案 議決)

10月 総務教育常任委員会報告:公表
